


# らくらくBOOK


2-A. 操作編 / 元請<基本>

# 「現場Plus」ってなに??

「現場Plus」は工程や進捗、図面など工事に必要な情報をリアルタイムで共有することで、現場のミスや手戻りを減らし、業務全体を円滑化するサービスです。

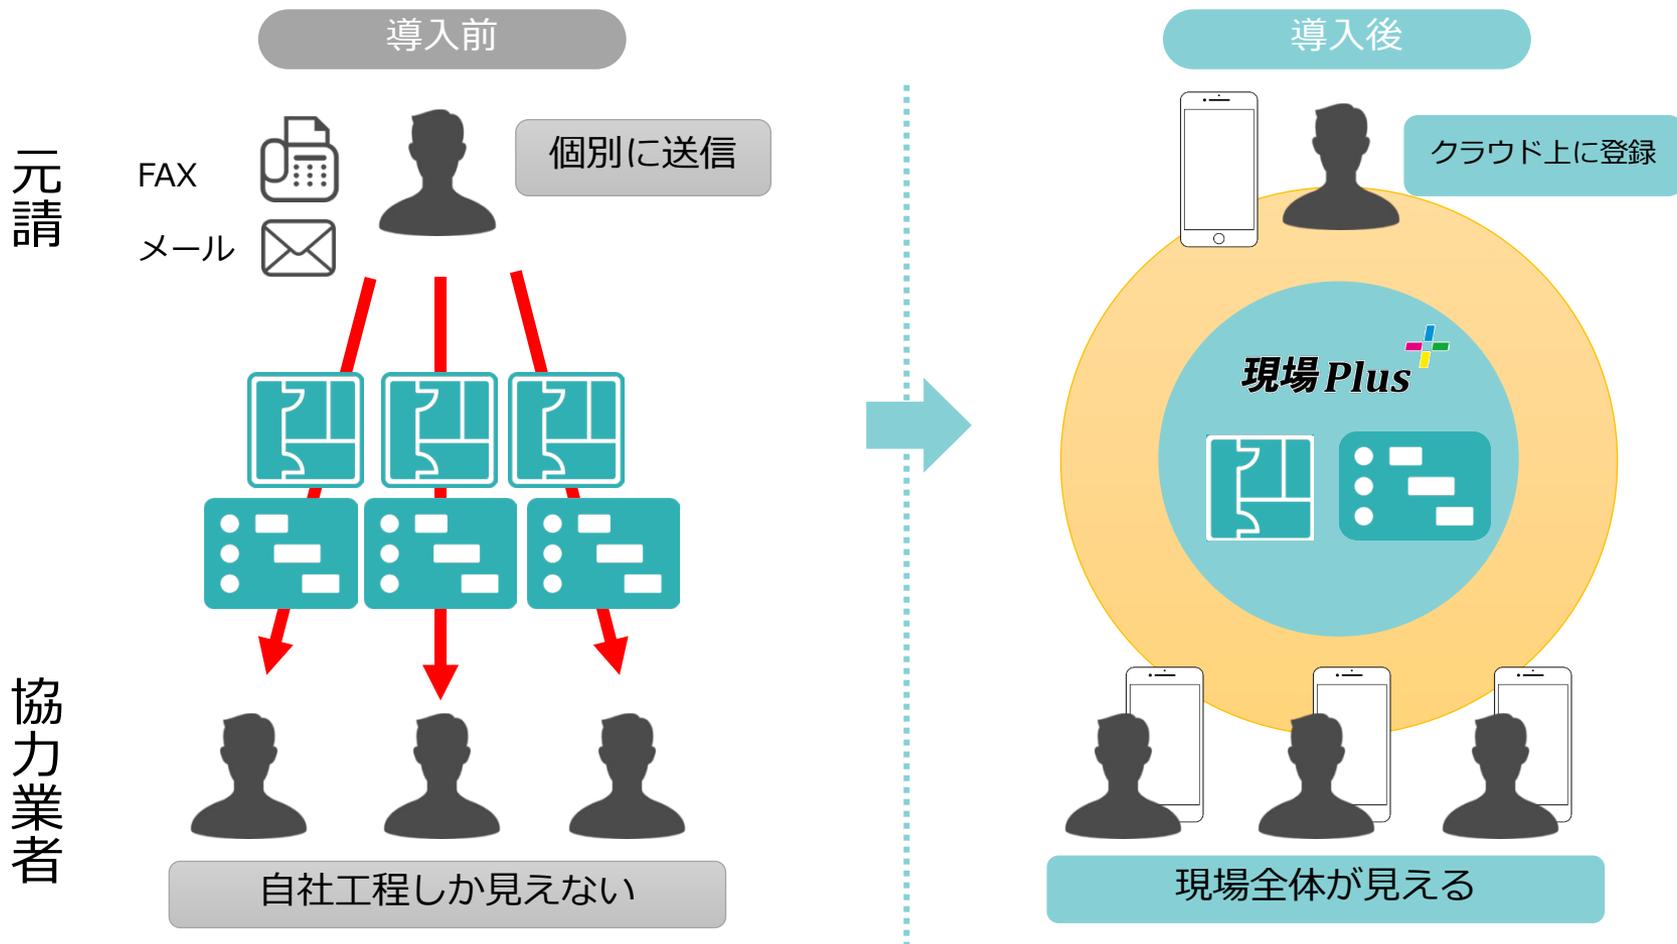


# できること



## 工程管理

工程表の作成  
進捗の確認



## 掲示板

現場毎の一斉連絡



## 私書箱（トーク）

個別・グループトーク



## 写真・図面・書類

写真/図面/書類の  
保存・閲覧



## マップ連携

現場の位置を  
地図上に表示

# 目次

---

01. 準備	P. 5
02. アプリケーションのインストール	P. 6
03. ログイン	P. 8
04. ダッシュボード	P. 9
05. 現場登録	P. 10
06. 工程表	P. 14
07. 掲示板	P. 24
08. トーク（私書箱）	P. 26
09. 写真・図面・書類	P. 27
10. 縦横断工程表	P. 29
11. パスワードの変更	P. 31
12. ダッシュボード（新着・予定ダッシュボード）	P. 32

# 1. 準備

## 準備するもの

①

利用する端末

(スマートフォン・タブレット・パソコン等)



②

テナント番号

ログインID

パスワード



一部パソコンからしか操作できない設定があります  
パソコンからのログインURL

<https://apg.kensetsu-cloud.jp/main/dyapp>



## 2. アプリケーションのインストール (iOS)



スマートフォン、タブレットに「現場Plus」のアプリをインストールします。

iOS端末 (iPhone/iPad等のアップル製品)



「ダイテック」で検索


! ←QRコードでも検索できます

## 2. アプリケーションのインストール (Android)



スマートフォン、タブレットに「現場Plus」のアプリをインストールします。

Androidの端末 (アンドロイド)



「ダイテック」で検索




←QRコードでも検索できます

# 3. ログイン



! パソコンからのログインURL  
<https://apg.kensetsu-cloud.jp/main/dyapp>

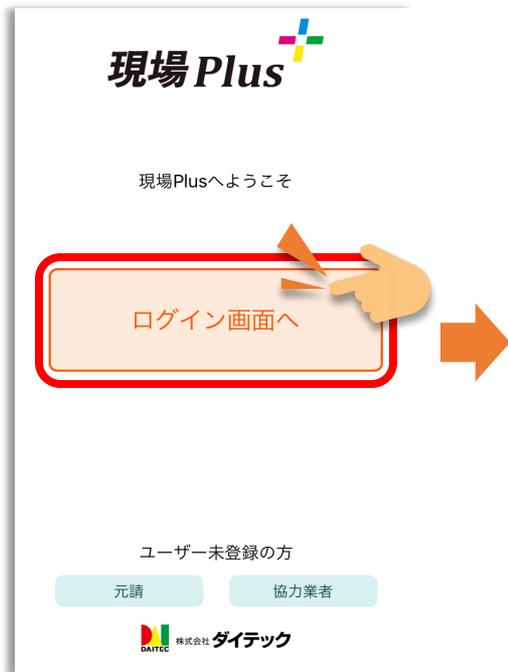

テナント番号

ログインID

パスワード

ログイン

! ログインできない場合  
①全角文字が使われていませんか？  
②大文字・小文字は正しいですか？  
③スペースが入っていませんか？


# 4. ダッシュボード



自身の担当現場のみ表示されます



工程表が表示されます

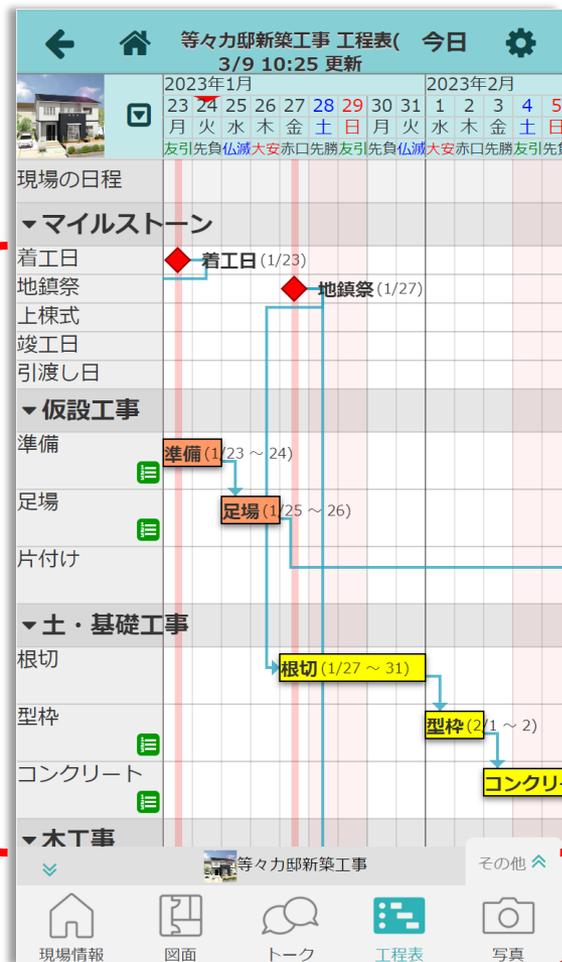

機能アイコン

# 5. 現場登録 ～現場新規登録～



**\*は必須項目です**

登録画面が開きます

現場 Plus

5030354  
DAITEC  
ダイテックホーム

担当現場

メニュー

- 初期設定
- ユーザーオプション
- ヘルプ
- ショートカット
- 現場新規登録**
- 現場グループ新規登録
- 縦横断工程表
- チェックリスト一覧
- 点検一覧
- 納品管理
- 工程担当一括割当
- ユーザー一括登録

キャンセル 現場新規登録 登録

現場名 \*  
例：山田邸 新築工事

現場名カナ  
例：ヤマダテイ シンチクコウジ

工事名  
例：山田邸 新築工事

工事名カナ  
例：ヤマダテイ シンチクコウジ

現場番号 ?

公開 | 着工前・工事中  
非公開 | 商談中・契約済・完成・受注できず

工事状態  
商談中 | 契約済 | 着工前 | 工事中 | 完成 | 受注できず

協力業者には公開されません

# 5. 現場登録 ～社内担当者登録～



キャンセル 現場新規登録 ✓登録

現場名 \*  
例：山田邸 新築工事

工事責任者  
**室町 太郎** ✓

営業担当  
営業担当を選択 ✓

工事担当  
工事担当を選択 ✓

設計担当  
設計担当を選択 ✓

納品管理担当  
納品管理担当を選択 ✓

その他担当  
その他担当を選択 ✓

✓登録

キャンセル 現場新規登録 ✓登録

元請グループ

工事責任者を選択

1名を選択中

**現場 進** ✓

小林 大地  
斉藤 宏  
田中 仁  
テスト 社員  
中村 遼太  
室町 太郎

✓OK  
✓登録

現場Plus

5030354  
DAITEC  
ダイテックホーム

**中** 中部支店  
現場 進

担当現場 所属元請グループ担当 検索

赤モード: 中 並び: 現場重要度

現場番号,現場名,工事名,現場住所で絞り:

室町邸新築工事 \*\*\*\*\*  
北海道札幌市中央区北四条東1-2-3 BK-0028 商談中

大宮邸内装リフォーム工事 \*\*\*\*\*  
東京都品川区大井 BK-0006 商談中

等々力邸新築工事 \*\*\*\*\*  
神奈川県川崎市中原区等々力1-1 2階 100㎡ (30.25坪) BK-0001 工事中

丸山邸リフォーム工事 その他

現場 掲示板 トーク 入退場 写真追加

☑チェックされた人のダッシュボードに現場が追加されます

# 5. 現場登録 ～協力業者登録①～



協力業者を登録したい現場を選択



「現場情報」の画面に切り替え



「協力業者」タブを選択



下方向にスクロール



# 5. 現場登録 ～協力業者登録②～



協力業者一覧の「編集」を選択



登録したい協力業者名に☑チェック



「保存」を押して登録完了

# 6. 工程表 ～作成①～




工程表を作成したい現場を選択



「工程表」の画面に切り替え



「工程表追加」を選択

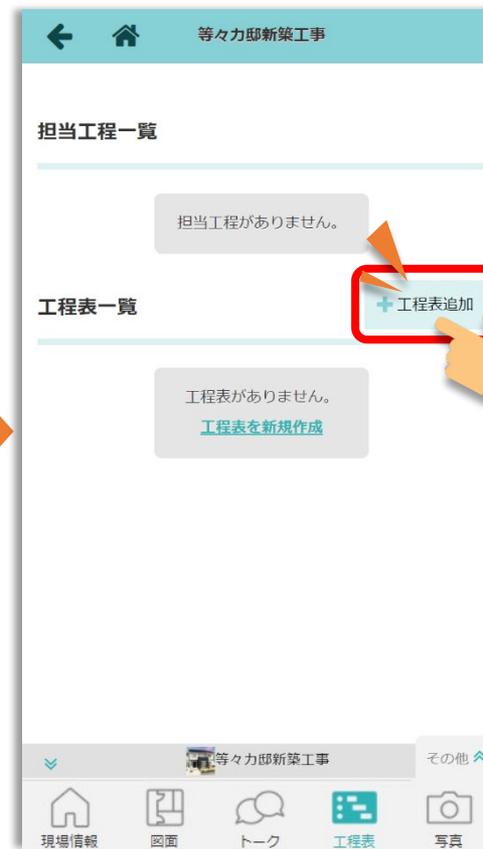

## 6. 工程表 ～作成②～



\* 必須項目を入力

キャンセル 工程表新規作成 **新規作成**

現場 \*

等々力邸新築工事

日程	着工日	上棟日	完成日	引渡日

工程表名 \*

等々力邸新築工事 工程表

工程表の表示期間 \*

着工日・引渡日  
をセット

年 / 月 / 日

年 / 月 / 日

参照元

標準工程表 既存の工程表 なし

選択してください

標準工程表の1日目を次の日付に指定 :

年 / 月 / 日

### 選べる参照元4種類

#### 標準工程表

初期設定で登録したテンプレートを元に、  
工程表を簡単に作成できます。

#### 既存の工程表

作成済みの他工程表をコピーします。

#### Excelファイル ※パソコンのみ表示されます

他の現場の「工程表取込用Excel出力」機能に  
て出力したExcelを取り込みます。

#### なし

白紙の工程表を作成します。

# 6. 工程表 ～編集①～



※工程表の作成・編集はパソコンで操作してください。

👉 <https://apg.kensetsu-cloud.jp/main/dyapp>

等々力邸新築工事 工程表(等々力邸新築工事) 今日 17:00 更新

現場の日程

- ▼ マイルストーン
  - 着工日 (1/23)
  - 地鎮祭 (1/27)
- ▼ 仮設工事
  - 準備
  - 足場
  - 片付け
- ▼ 土・基礎
  - 根切
  - 型枠
  - コンクリート
- ▼ 木工事
  - 軸組
  - 屋根下地

工程名	期間	日数	担当者
現場の日程			
▼ マイルストーン			
着工日	1/23		
地鎮祭	1/27		
上棟式	3/10		
竣工日	5/8		
引渡し日	5/17		
▼ 仮設工事	1/23 ~ 3/21	42日	
準備	1/23 ~ 24	2日	
足場	1/25 ~ 26	2日	
片付け	3/20 ~ 21	2日	
▼ 土・基礎工事	1/27 ~ 2/8	9日	
根切	1/27 ~ 31	3日	
型枠	2/1 ~ 2	2日	
コンクリート	2/3 ~ 8	4日	
▼ 木工事	2/16 ~ 4/4	34日	
軸組	2/16 ~ 27	8日	
屋根下地	2/28 ~ 3/9	8日	

## 工程表オプション

表示オプション ?

- 六曜の表示
- ▼三隣亡の表示
- コメントの表示

その他操作 ?

- 変更通知メール送信
- 工程表PDF出力
- 工程表取込用Excel出力
- Excel取込
- 工程表削除

添付ファイル一覧表示

工程チェック項目設定

PC版で編集

# 6. 工程表 ～編集②～



※工程表の作成・編集はパソコンで操作してください。

**①工程の追加**  
工程名を入力し、ドラッグで期間指定

**②マイルストーンの追加**  
メニューより「下にマイルストーンを追加」を選択し、マイルストーン名を入力して、指定日をクリック

**③グループの追加**  
メニューより「下にグループを追加」を選択し、グループ名を入力して、グループ内に工程を追加

**!**

- ◆ ・ ・ マイルストーン  
イベント日を表すマークです
- ・ ・ 工程バー  
工程期間を表すバーです
- ↳ ・ ・ リンク線  
工程の前後関係を表す線です

**仮設工事**

準備	1/23 ~ 24	2日
足場	1/25 ~ 26	2日
片付け	3/20 ~ 21	2日

**土・基礎工事**

根切	1/27 ~ 31	3日
型枠		2日



# 6. 工程表 ～担当者登録① 一括登録～



日表示 工程管理 工程担当者割当...

工程名	期間	日数	担当者	
	2023年1月		2023年2月	
		23	30	6

着工日  
地鎮祭  
上棟式  
竣工日  
引渡し日  
▼ 仮設工事 1/23  
準備 1/23  
足場 1/23  
片付け 3/24  
▼ 土・基礎工事 1/23  
根切 1/23  
型枠 2/24  
コンクリート 2/24  
▼ 木工事 2/24  
軸組 2/24  
屋根下地 2/24  
外部下地 3/24  
内部下地 3/24  
洋室仕上 3/24

### 工程担当者の割り当て

① 工程の選択

- 仮設工事
  - 準備
  - 足場
  - 片付け
- 土・基礎工事
  - 根切
  - 型枠
  - コンクリート
- 木工事
  - 軸組
  - 屋根下地

② 担当者の選択

- 会社をタグで絞り込み  業種で絞り込み
- 社員をタグで絞り込み

- 大塚硝子
- 大塚 大地
- 家創工房
- 家田 建
- 家田 創
- 蒲田設備
- 蒲田 順一
- 神田大工

担当未割り当ての工程のみ表示 3個の工程を選択中  現場未参加の協力業者も表示

プレビュー(上: 選択工程 下: 担当者の他の担当工程)

準備	足場	2月	3月
■	■	■	■

③適用  閉じる

# 6. 工程表 ～担当者登録② 個別登録～



等々力即新築工事 工程表( 今日) 3/8 16:03 更新

2023年3月

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

友引先負仏滅大安赤口先勝友引先負仏滅大安赤口先勝友引先

屋根工事

屋根葺

▼ 建具・硝子工事

外部建具工事

内部建具工事

硝子工事

▼ 左官・タイル工事

基礎天端均し

外部下塗・仕上

内部下塗・仕上

タイル貼

現場情報 図面 トーク 工程表 写真

屋根葺 (3/10 ~) 13)

屋根葺

工程情報 コメント チェックリスト

工程名	屋根葺	編集
期間	3/10 ~ 13	編集
担当者		編集
進捗	未着手	編集

工事開始

工事完了

屋根葺 (3/10 ~) 13)

屋根葺

工程情報 コメント チェックリスト

担当者

工程担当者を選択

OK キャンセル

等々力即新築工事 工程表( 今日) 3/9 10:25 更新

2023年3月

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

友引先負仏滅大安赤口先勝友引先負仏滅大安赤口先勝友引先

屋根工事

屋根葺

▼ 建具・硝子工事

外部建具工事

内部建具工事

硝子工事

▼ 左官・タイル工事

基礎天端均し

外部下塗・仕上

内部下塗・仕上

タイル貼

現場情報 図面 トーク 工程表 写真

# 6. 工程表 ~コメント入力~



コメントを追加すると、  
担当業者にのみ通知されます

# 6. 工程表 ～出力～



等々力邸新築工事 工程表(等々力邸新築工事)  
3/9 10:25 更新 今日

現場の日程

▼マイルストーン

着工日  
地鎮祭  
上棟式  
竣工日  
引渡し日

▼仮設工事

準備  
足場  
片付け

▼土・基礎工事

根切  
型枠

工程表オプション

表示オプション

- 六曜の表示
- ▼三隣亡の表示
- コメントの表示

その他操作

- 変更通知メール送信
- 工程表PDF出力**
- 工程表取込用Excel出力
- Excel取込
- 工程表削除

添付ファイル一覧表示

工程チェック項目設定

PC版で編集

キャンセル 工程表PDF出力

等々力邸新築工事  
等々力邸新築工事 工程表  
(1月23日 ~ 6月30日)

出力

出カオプション

期間 週間 月間 **全期間** 詳細

出カ会社名 タイテックホーム  
出カ会社名設定ページを表示

▼ その他オプション

- 「現場の日程」行を表示する
- 現場の日程やマイルストーンがある日付に縦線を表示する
- グループ内のタスク、マイルストーンを同じ行にまとめて表示する
- リンク線を表示する
- リンク線を表示する
- 期間外の工程の行も表示する
- 行ヘッダを表示する
- 行ヘッダを表示する
- 工程名
- 担当者
- 開始予定日
- 終了予定日

工程バーの表示

- 工程バー上に工程名を表示する
- 工程期間も表示する
- 担当者も表示する


現場情報 図面 トーク 工程表 写真

# ～掲示板とトークの違い～

<掲示板>




一斉に連絡（一方通行）

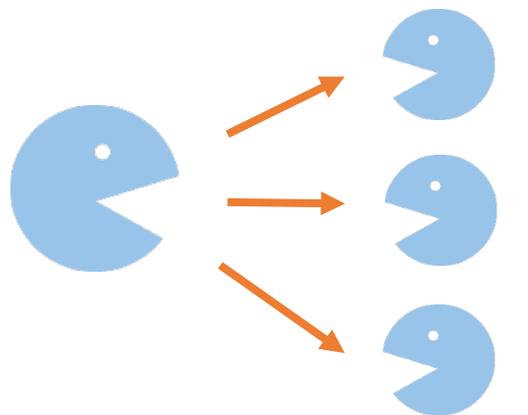


元請

協力業者

<トーク>  
(私書箱)




個々に会話（双方向）



元請

協力業者

グループで会話（双方向）  
何人でもグループ会話へ  
参加可能

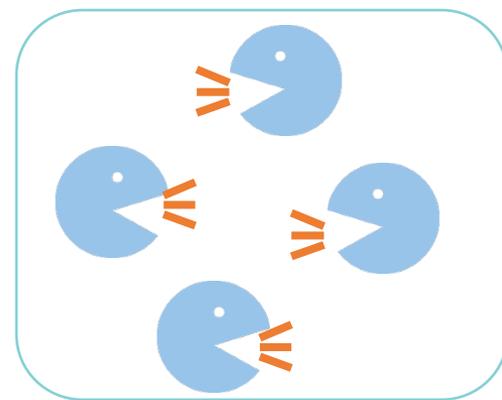

グループ参加者

# 7. 掲示板 ～投稿～



掲示板を投稿したい現場を選択



「掲示板」の画面に切り替え



\* 必須項目を入力

## 通常掲示板と当日掲示板

	公開期間	閲覧権限	
		元請	協力
通常	削除されるまで	全員	その現場に登録されている全ユーザー
本日のみ	作成日のみ	全員	作成日に担当工程があるユーザーのみ

# 7. 掲示板 ～既読・未読確認～



投稿済の掲示板



未読ユーザー数



個別の電話やチャットに移動できます

# 8. トーク ～メッセージの送信～



画面下部の「トーク」を選択



トークの相手・グループを選択




新規作成

新規


既存のトークグループ



宛先にチェック

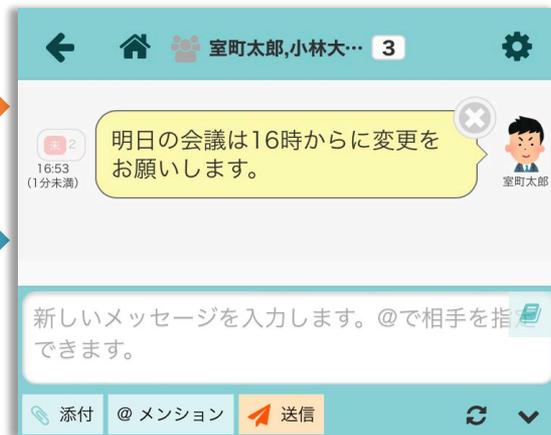

# 9. 写真・図面・書類 ～登録～

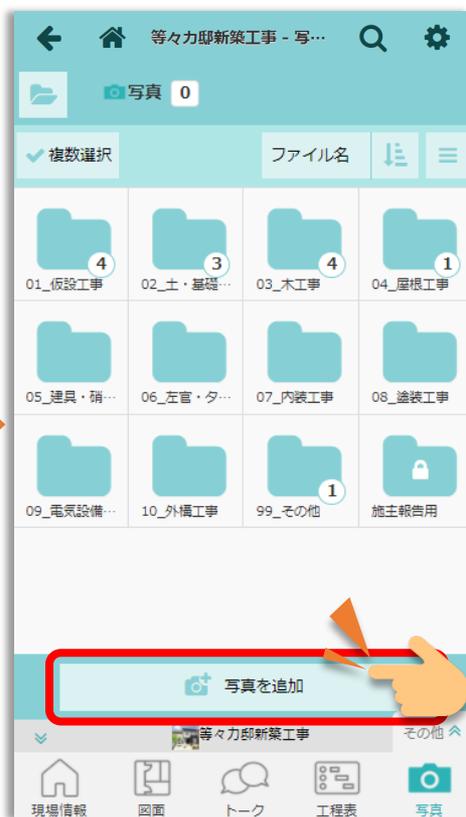

登録したい  
「機能アイコン」を選択

「写真を追加」を選択

！  
上記画像は写真の登録画面です  
図面・書類の操作も同様です

端末内の写真をアップロード  
写真を撮ってそのままアップロード

## 9. 写真・図面・書類 ～確認～



確認したい写真を選択

図面・書類の操作も同様です

# 10 . 縦横断工程表 ～現場ビュー（縦断）～



複数現場の工程を縦断して見ることができます

現場 Plus

5030354  
ダイテックホーム

太郎

担当現場

表示モード

現場番号,現場名

等々カ  
神奈川県川崎市  
2階 10

品川邸  
2021年5月8日  
東京都品川区

品川邸  
2020年11月  
東京都品川区  
1階 99

大坂邸

現場 掲示板

メニュー

初期設定

ユーザーオプション

ヘルプ

ショートカット

現場新規登録

現場グループ新規登録

縦横断工程表

チェックリスト一覧

点検一覧

納品管理

工程担当一括割当

ユーザー一括登録

表示する工程の単位  
日・週・月を切り替えます

表示する現場と工程  
を絞り込みます

A 安成邸新築工事

B 大坂邸新築工事

C 品川邸新築工事


▼を押して工程表を展開・収縮します

# 10. 縦横断工程表 ～担当ビュー（横断）～



複数現場の工程を横断して見ることができます

現場ビュー／担当ビューの切り替え

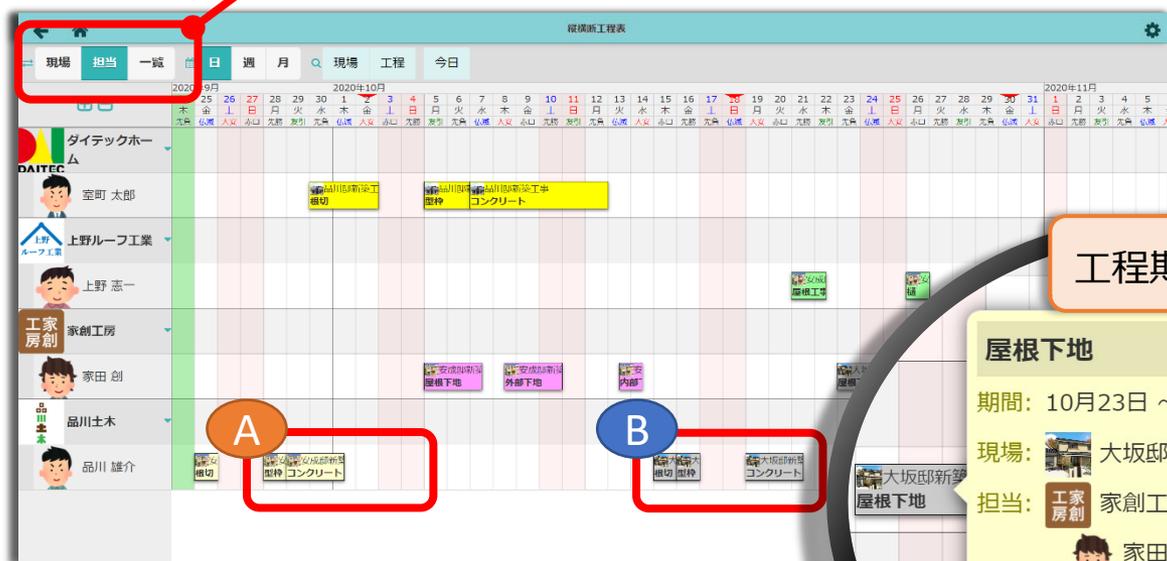

工程期間を編集

**屋根下地** 未

期間: 10月23日 ~ 27日

現場: 大坂邸新築工事

担当: 工家房創 家創工房 家田 創

0 0

現場の詳細情報へ

協力業者工程表へ

協力業者カレンダーへ

工程表へ

工程を編集

# 11. パスワードの変更



## ダッシュボード > メニュー > ユーザーオプション > 4. パスワード変更

現場Plus

メニュー

初期設定

**ユーザーオプション**

ヘルプ

ショートカット

現場新規登録

現場グループ新規登録

縦横断工程表

チェックリスト一覧

点検一覧

納品管理

工程担当一括割当

ユーザー一括登録

ユーザーオプション

1. 会社アイコン変更
2. 印刷用会社アイコン変更
3. ユーザーアイコン変更
- 4. パスワード変更**
5. メール・アプリ通知受信設定
6. 現場機能設定
7. ユーザー定型文設定
8. その他設定

パスワード  
※半角英・数・記号(@,#,\$など)  
**全て含む6文字以上**

キャンセル パスワード変更 保存

「新しいパスワード」には半角英語・半角数字・半角記号を含む、6文字以上の文字列を入力してください。

パスワードの確認

現在のパスワード \*

パスワードの変更

新しいパスワード \*

新しいパスワード (再入力) \*

保存

キャンセル

# 12. ダッシュボード（新着・予定ダッシュボード）



ダッシュボードは2パターンの切り替えが可能です



従来の「現場選択ダッシュボード」

新着情報、予定の確認に特化したダッシュボードをご用意

新着・予定ダッシュボード

